R6国道17号美佐島地区道路改良工事
工　事　説　明　書

陽春の候、皆様には益々御健勝のことと拝察申し上げます。
日頃より関係事業につきましては、御理解と御協力をいただき心より感謝申し上げます。
今年も昨年に引き続き、美佐島・川窪地区において、道路改良工事を行います。
工事に伴い、国道17号線を**夜間片側交互通行規制**にて施工いたします。
作業員には騒音・振動には十分注意するよう指導し作業を行います。
御協力の程、宜しくお願い致します。

令和 7年 4月　作成
株式会社　種村建設

1. 工事概要　：以下の工事を施工いたします。

工事名　　：R6国道17号美佐島地区道路改良工事

工期　　：令和 7年 3月10日～令和 7年 9月30日

工事概要　：道路改良 1 式
地盤改良工　置換工 224m2、ｶﾙﾊﾞｰﾄ工　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 114m、舗装工 376m2
縁石工　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 80m、区画線工 1式、仮設工　鋼矢板圧入・引抜 280枚

2. 工事の目的

・現在南魚沼市管内にて電線、電話線等を地下埋設するための事業が始まっています。
それを目的とした「共同溝」を設置するために、現在埋設されている用排水路ボックスを17号下り線路肩、本線へ移設します。移設によって近い将来架空線、電柱の無いことにより道路環境の向上と災害時の被害減少が図られます。

3. 施工上の留意点

・作業時間は、日中は、午前8時00分から午後5時30分、夜間は午後8時00分から午前5時00分までとし日中作業は、準備・製作作業のため規制なし。夜間作業は、矢板打ち・土工事・ｶﾙﾊﾞｰﾄ工・舗装工事を行うため片側交互通行規制とします。
・工事区域には仮設防護柵を設置し、点滅灯や矢印版等設置し車両への安全対策を行います。

4. 工　程　表

月	3月		4月			5月			6月			7月			8月			9月	
日	10	28	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	30
工　種																				
道路改良																				
道路土工																				
地盤改良工																				
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工																				
排水構造物工																				
舗装工																				
縁石工																				
区画線工																				
構造物撤去工																				
仮設工																				
土留・仮締切工																				
交通管理工																				
準備・後片付け																				

5. 施工位置図

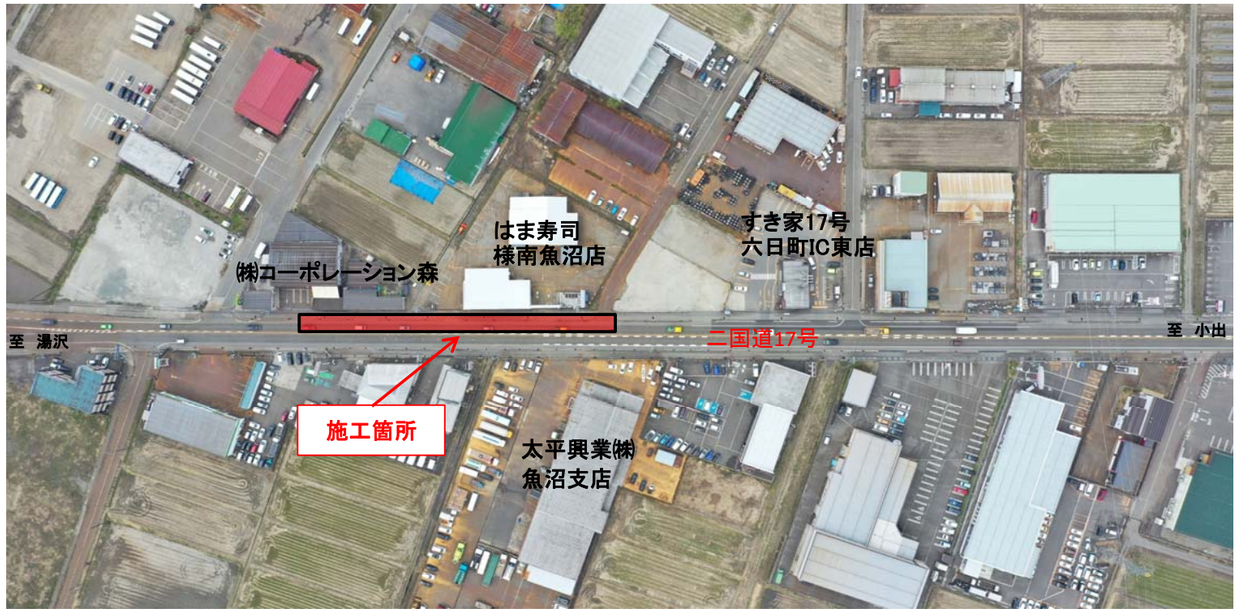

6. 規制図

片側交互通行規制

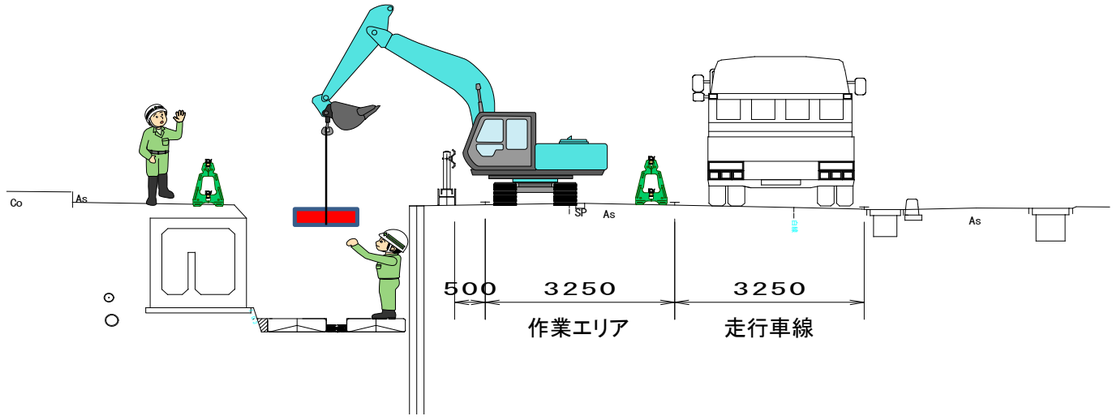

【夜間片側交互通行規制】について

上記の規制形態にて**4月20日～9月10日（予定）**まで行います。（日中は解放します）

地域の皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

作業時間：午前8時00分から午後5時30分（予定）
午後8時00分から午前5時00分（予定）
休　　日：（原則）毎週土曜日・日曜・祝日
※工程により休日作業も行う場合があります。

運行車両：資材運搬車両、ｸﾚｰﾝ車、ﾕﾆｯｸ車
留意事項：作業中の騒音、振動に気を付けて作業するように徹底させます。お気づきの点があれば記載のお問い合わせ先まで一報お願いします。

お問い合わせ先
国土交通省 長岡国道事務所
小出維持出張所
住所：魚沼市井口新田1020-2
℡(025)792-0839（担当：鈴木、藤井）
株式会社　種村建設　美佐島地区道路改良作業所
住所：南魚沼市水尾417番地
℡(025)779-2311（担当：　林、大嶋）

※　尚、ホームページにて工事情報や進捗などが掲載してあります。
スマホからは、QRコードにて利用できます。
https://taneken.jp/achievement/misashima/

夜間　片側交互通行規制

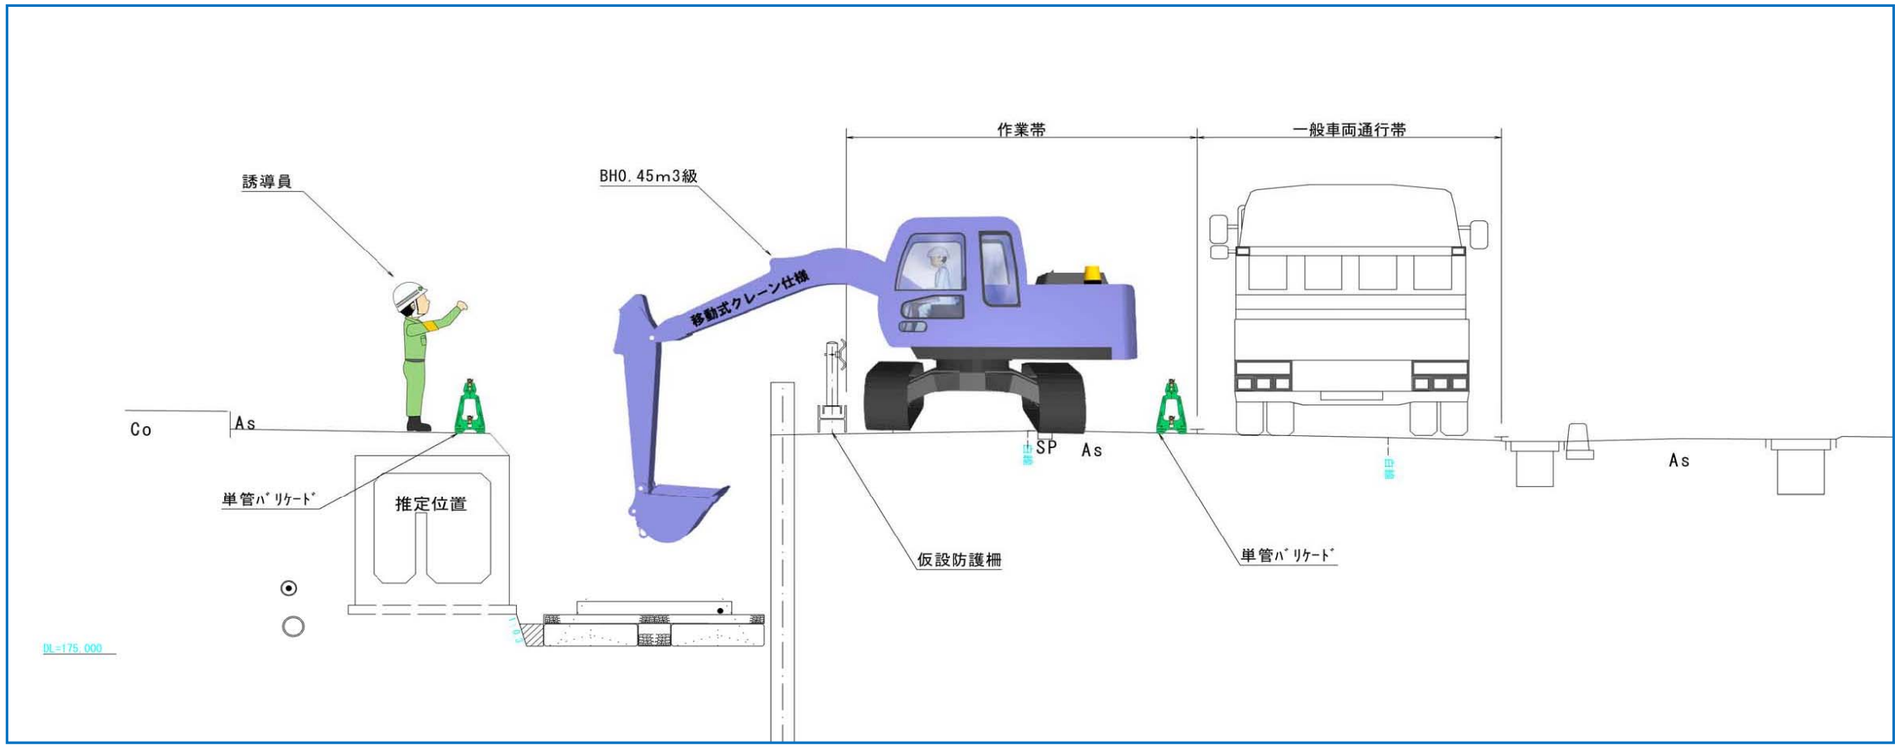
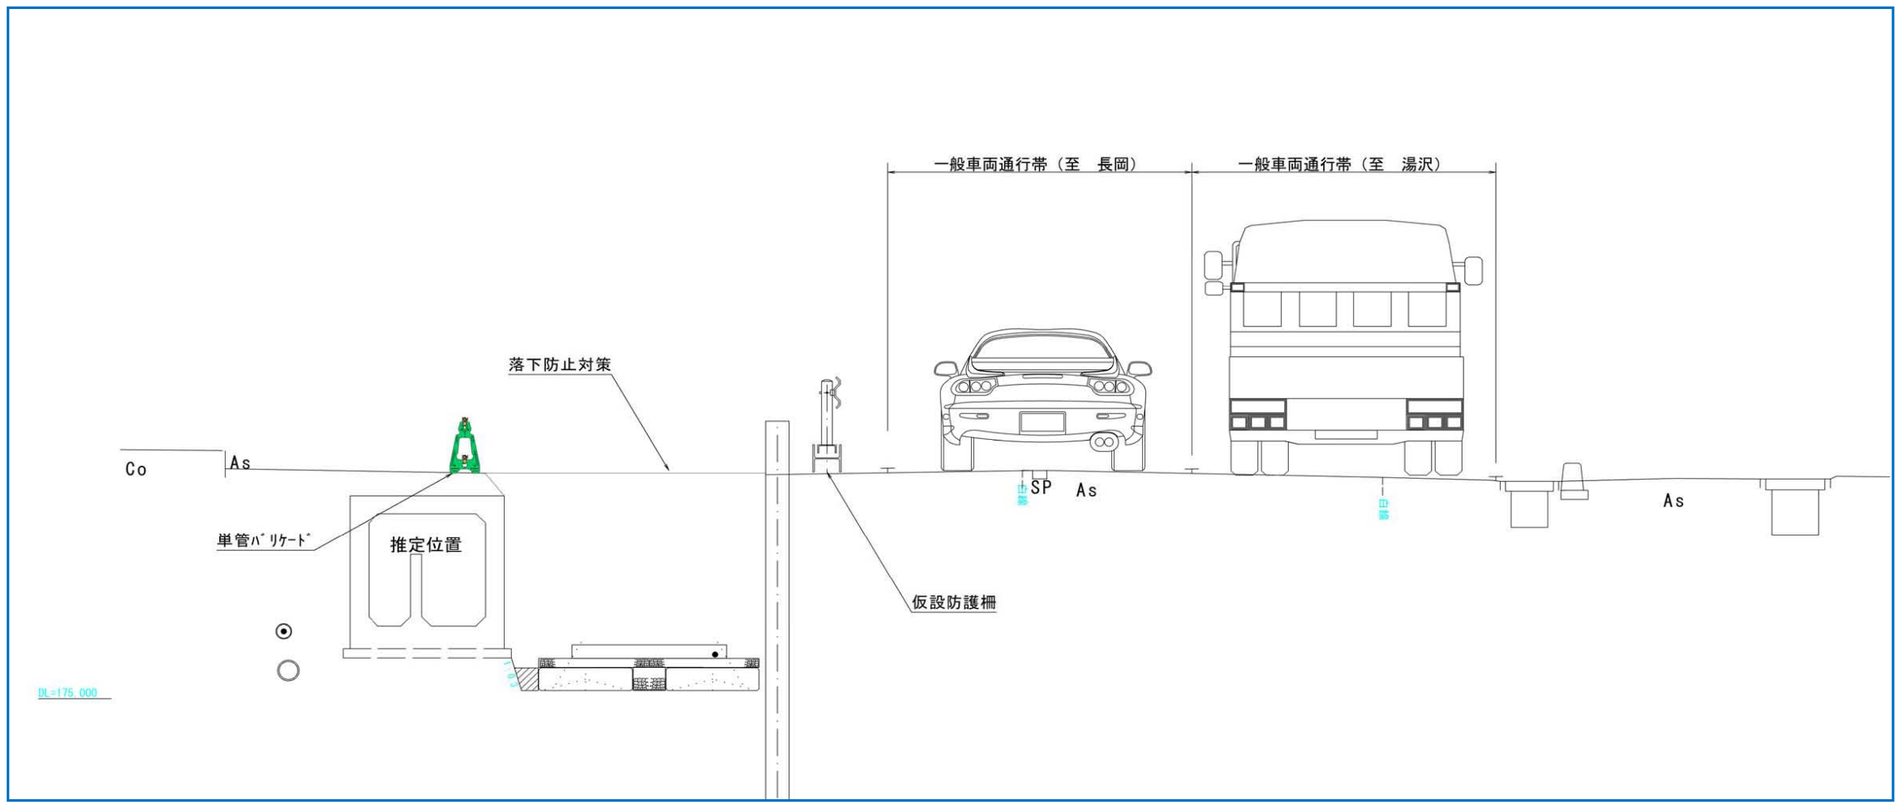
日中　路肩通行規制
